
LA SELEZIONE DEI GAL E DEI PSL ITALIANI
PROCEDURE E STATO D'AVANZAMENTO AL 31 MARZO 2010

Lo stato di avanzamento della selezione dei Gal e dei PSL

Di seguito viene illustrata l'articolazione e lo stato d'avanzamento delle procedure di selezione adottate nei PSR italiani. Nei primi mesi del 2010 si segnalano significativi progressi:

- completamento della selezione dei PSL in Calabria (16 PSL) ed in Sardegna (13 PSL);
- selezione dei Gal in Campania (ulteriori 9 Gal, per un totale di 13) e la successiva approvazione delle graduatorie in base alle quali risultano ammessi 11 PSL;
- selezione dei 3 Gal della Val d'Aosta ed approvazione (condizionata al recepimento delle osservazioni mosse dalla Commissione di valutazione) dei relativi PSL;
- pubblicazione del bando per la selezione dei PSL in Abruzzo e Molise.

Nel complesso, i Gal selezionati sono 175. Di questi, 122 hanno ottenuto l'approvazione dei rispettivi PSL, mentre 53 sono in attesa del completamento degli esiti delle procedure istruttorie dei PSL presentati. Solo in 3 regioni non sono ancora stati individuati i Gal da sostenere nell'ambito dei PSR regionali 2007-2013 (Abruzzo, Basilicata e Lazio).

Dunque, il quadro presenta ancora molte criticità, ma si può ragionevolmente ritenere che nei prossimi mesi si dovrebbe avere il quadro definitivo riguardo ai Gal ed ai PSL approvati. In ogni caso, va anche sottolineato che i tempi necessari alla selezione dei PSL appaiono mediamente eccessivamente lunghi, e tale circostanza produce effetti negativi sull'avanzamento finanziario dell'Asse, con conseguenze evidenti sull'applicazione del meccanismo del disimpegno automatico.

Tab. 1. Selezione dei Gal e dei PSL in Italia: situazione al 31 marzo 2010

	N. Gal previsti (**)	Pre-bando (pre-Selezione GAL)				Selezione PSL			
		Pubblicazione	Scadenza	Chiusura istruttoria	Esito (Gal ammessi)	Pubblicazione	Scadenza	Chiusura istruttoria	Esito (PSL ammessi)
Abruzzo	6					10/02/10	23/04/10		0
Basilicata	8					16/10/08	30/06/09		0
P.A. Bolzano	4	22/11/07	07/01/08	17/03/08	4	23/03/08	23/06/08	13/10/08	4
Calabria	14					01/09/08	30/01/09	18/01/10	16
Campania (*)	14	05/08/09	18/09/09	05/12/09	13	25/01/10	24/02/10	24/03/10	11
Emilia Romagna	5					30/05/08	08/09/08	18/12/08	5
Friuli	5					28/05/08	01/09/08	10/07/09	5
Lazio	8					21/05/09	15/12/09		0
Liguria	9	23/05/07	18/06/07	17/07/08	9	17/07/08	15/09/08	20/03/09	9
Lombardia	10	20/02/07	01/04/07	11/05/07	19	13/06/08	13/07/08	14/07/09	16
Marche	5	20/12/07	09/01/08	10/03/08	6	05/06/08	30/09/08		0
Molise	3	16/01/09	14/02/09	27/03/09	3	31/10/09	15/01/10		0
Piemonte (*)	12					24/08/08	16/11/08	04/03/09	13
Puglia	25	23/10/08	23/12/08	29/01/10	25	15/10/09	29/01/10		0
Sardegna	15	30/04/08	30/07/08	31/03/09	13	23/12/08	31/03/09	25/02/10	13
Sicilia	15	29/05/09	22/07/09	15/12/09	17	04/09/09	15/12/09		0
Toscana (*)	7	21/01/08	21/02/08	13/07/08	7	14/05/08	13/07/08	03/08/09	7
P.A. Trento	1					11/04/08	02/03/09	18/08/09	1
Umbria	5					11/06/08	25/08/08	14/06/09	5
Valle d'Aosta	4					07/11/08	19/05/09	19/03/10	3
Veneto	14					12/02/08	12/05/08	10/03/09	14
Italia	189					16/11/08	12/03/09	14/10/09	119

(*) Le date relative a Campania e Piemonte (selezione Gal) e Toscana (selezione PSL) sono rappresentate da medie.

(**) Nella colonna "N. Gal previsti" sono inseriti, ove disponibili, i dati dei PSR recentemente rimodulati. In grassetto corsivo le previsioni relative ai PSL non ancora approvati.

Fonte: Rete Rurale Nazionale - Task Force Leader su dati delle Autorità di Gestione dei PSR 2007-2013.

I tempi di selezione si attestano su una media (destinata a crescere quotidianamente, fino all'approvazione dell'ultimo PSL) di oltre 669 giorni dalla data di approvazione del PSR. Si tratta di un dato decisamente poco brillante, anche confrontando gli stessi dati con i risultati definitivi della programmazione 2000-2006 Leader+, nel corso della quale i tempi medi richiesti per il

completamento della selezione dei Gal furono di 435 giorni.

Si propone, di seguito, un aggiornamento dettagliato dell'avanzamento della procedura selettiva, sezionata in fasi elementari, partendo dal momento della Decisione di approvazione di un PSR da parte della Commissione ed individuando gli attori coinvolti.

Tab. 2. Selezione del Gal e dei PSL in Italia al 31.03.10: i tempi (in giorni) delle fasi

Decisione di approvazione PSR	1° fase				2° fase				Totale giorni per:				
	Pubblicazione	Termini	Fine istruttoria	Totale gg	Pubblicazione	Termini	Fine istruttoria	Totale gg	pubblicare	elaborare	istruire	Totale gg	
Abruzzo 19/12/07	784	72	0	856					784	72	-	856	
Basilicata 18/02/08	241	150	381	772					241	150	381	772	
P.A. Bolzano 12/09/07	71	46	70	187	6	92	112	210	77	138	182	397	
Calabria 29/11/07	277	151	353	781					277	151	353	781	
Campania 20/11/07	503	97	193	793	50	34	24	108	553	131	217	901	
Emilia Romagna 12/09/07	261	101	101	463					261	101	101	463	
Friuli V.G. 20/11/07	190	96	312	598					190	96	312	598	
Lazio 15/02/08	461	208	106	775					461	208	106	775	
Liguria 20/11/07	-181	26	395	240	-	60	186	246	-	181	86	581	486
Lombardia 16/10/07	-238	40	40	-158	399	30	366	795	161	70	406	637	
Marche 15/02/08	-57	20	61	24	87	117	547	751	30	137	608	775	
Molise 25/02/08	326	29	41	396	218	76	75	369	544	105	116	765	
Piemonte 28/11/07	313	77	95	485					313	77	95	485	
Puglia 18/02/08	248	61	233	542	63	106	61	230	311	167	294	772	
Sardegna 28/11/07	154	91	76	321	70	98	331	499	224	189	407	820	
Sicilia 18/02/08	466	54	44	564	-	102	106	208	466	156	150	772	
Toscana 16/10/07	97	31	33	161	50	60	413	523	147	91	446	684	
P.A. Trento 15/02/08	56	325	169	550					56	325	169	550	
Umbria 07/02/08	125	75	294	494					125	75	294	494	
Valle d'Aosta 18/02/08	263	193	304	760					263	193	304	760	
Veneto 17/10/07	118	90	302	510					118	90	302	510	
media Italia 19/12/07	213,2	96,8	171,6	481,6	94,3	77,5	222,1	393,9	258,1	133,7	277,3	669,2	


Legenda: procedura completata procedura da completare/avviare procedura non prevista

Tab. 3. Fasi, attori, tempi

Fase	Attore	n. giorni (*)
a. Predisposizione del bando pubblico	Autorità di Gestione (normalmente attraverso gli Uffici responsabili della programmazione dell'Asse 4)	258,1
b. Elaborazione delle strategie	Partenariati Locali	133,7
c. Istruttoria delle candidature	Autorità di Gestione (attraverso le Commissioni di valutazione e gli Uffici responsabili dell'istruttoria)	277,3
Totale		669,2

(*) medie al 31.03.2010

Fig. 1. I tempi delle procedure di selezione dei PSL in Italia al 31 marzo 2010

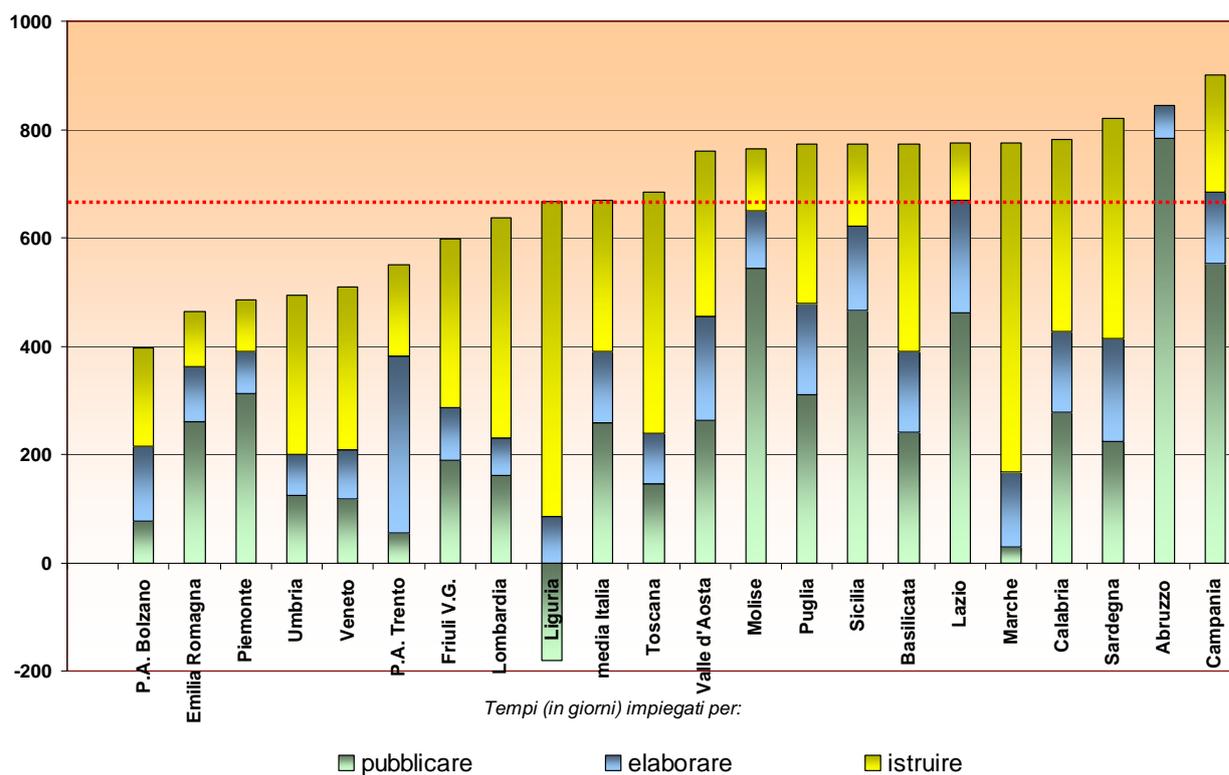

Fonte: Rete Rurale Nazionale - Task Force Leader su dati delle Autorità di Gestione dei PSR 2007-2013.
